



INVERSORA DE CAPILLA S.A. ALCANCE DEL PROYECTO

Grupo 3 - Sprint 7

INFORMACIÓN GENERAL

1. Introducción

La definición del alcance de este proyecto se articula sobre dos marcos de referencia. Por un lado, TOGAF ADM orienta la visión arquitectónica, estructurando los objetivos en torno a las dimensiones de negocio, sistemas y tecnología, y estableciendo la brecha entre la arquitectura base y la arquitectura destino como eje del trabajo. Por otro lado, las buenas prácticas de gestión de proyectos del PMBOK enmarcan la planificación operativa, a través de artefactos como el WBS, el cronograma Gantt y la matriz de stakeholders.

Este proyecto nace de la necesidad de mejorar el cómo la empresa seleccionada lleva a cabo sus procesos administrativo-contables. El objetivo para con el mismo es darle una propuesta de valor significativa a la empresa para que pueda integrar con mayor coherencia las distintas actividades que realiza a lo largo de su operatoria.

2. Alcance

Objetivos específicos

- 1. Diagnosticar la situación actual del negocio**, relevando los procesos administrativo-contables, comerciales y de obra, para identificar la brecha entre el estado actual y los objetivos estratégicos de la empresa.
- 2. Diseñar una arquitectura empresarial objetivo (TOGAF)** que defina los procesos, datos, aplicaciones y tecnología necesarios para soportar la gestión comercial, el seguimiento de obra y la toma de decisiones basada en datos.
- 3. Identificar y priorizar los procesos core del negocio** que requieren formalización (ciclo comercial, gestión de obra, administración), como insumo para una futura documentación a cargo de la empresa.
- 4. Definir un plan de transición con escenarios de implementación evaluados**, incluyendo un roadmap y recomendaciones de arquitectura tecnológica Cloud-First con acceso seguro (MFA) y soporte para operación móvil desde Los Cardales.
- 5. Evaluar y recomendar una solución tecnológica integrada** (suite SaaS de CRM + Gestión de Proyectos + BI), incluyendo el modelo conceptual de un repositorio único de datos, evaluando alternativas de mercado sin desarrollo a medida ni implementación. Esta recomendación se hará a través de un informe final de consultoría que se entregará al cliente.

Exclusiones

- 1. Implementación de las soluciones SaaS recomendadas** — el proyecto entrega la evaluación y recomendación de herramientas (CRM, Gestión de Proyectos, BI); la selección final, contratación e implementación quedan a cargo de la empresa.
- 2. Establecimiento del repositorio único de datos** — se entrega el diseño conceptual de la arquitectura de datos; su puesta en marcha y migración de información quedan fuera del alcance.
- 3. Formalización y documentación final de los procesos core** — el equipo identifica y prioriza los procesos a formalizar; la documentación detallada (manuales, procedimientos) y su mantenimiento quedan a cargo de la empresa.

4. Capacitación al equipo en el uso de las nuevas herramientas — queda fuera del alcance; es responsabilidad de la empresa o del proveedor de la solución elegida, una vez implementada.

5. Desarrollo de software a medida — el proyecto se limita a la evaluación de soluciones SaaS existentes en el mercado, sin desarrollo propio.

6. Expansión internacional — si bien es parte de la visión estratégica, está fuera del horizonte del presente proyecto de consultoría.

7. Configuración de conectividad segura (VPN/Zero Trust) — se trata como prerequisite técnico a resolver por la empresa, no como entregable de la consultoría.


8. Integración con sistemas contables externos — queda fuera del alcance inicial; es una evolución futura a cargo de la empresa una vez implementado el repositorio único.

9. Herramientas de análisis de mercado e inteligencia competitiva — clasificada como "Could Have" en el T02, queda fuera del alcance por no ser crítica para la transformación operativa inicial.

10. Implementación de dispositivos de obra (tablets ruggedizadas) — queda fuera del alcance por alto costo y complejidad logística.

Esquema de descomposición de trabajo

Figura 1: WBS — Esquema de Descomposición de Trabajo | OpenSource Consulting · Grupo 3

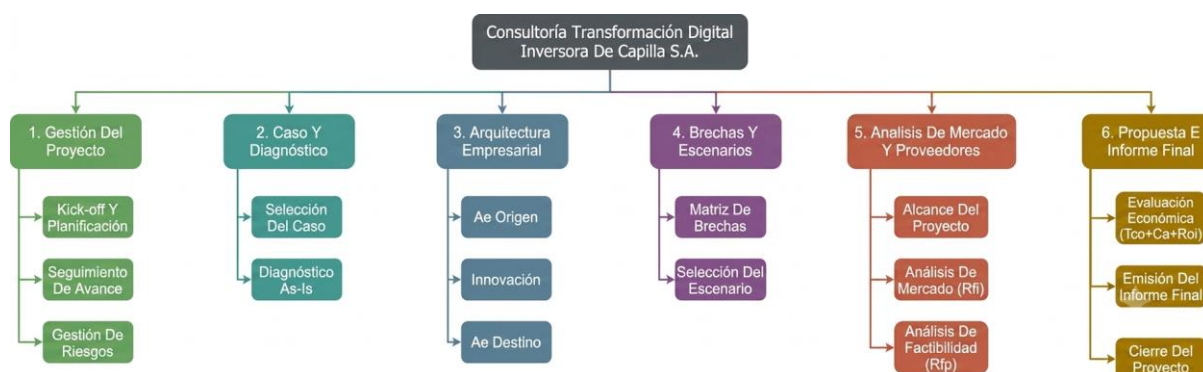

3. Beneficios esperados

Perfecto. **Ítem 4 — Beneficios esperados.**

Basándonos en la problemática del T01, los requerimientos del T02 y los objetivos estratégicos, proponemos:

Operativos:

1. Reducción de la carga manual de datos — la centralización en el repositorio único elimina la duplicación y re-ingreso de información entre Excels, apuntando al objetivo SMART del T01 de reducir un 80% la carga manual en 12 meses.

2. Trazabilidad completa de obra y proyectos — el seguimiento en tiempo real reemplaza la dependencia de la memoria de los directivos y las coordinaciones por WhatsApp para tareas críticas.

3. Mejora en la coordinación de contratistas — con entre 40 y 70 personas subcontratadas operando en campo, la herramienta de gestión de proyectos permite asignar tareas, hacer seguimiento y detectar desvíos sin depender de llamadas o mensajes informales.

Comerciales:

4. Incremento en la captación y cierre de leads — el CRM centralizado permite gestionar el embudo comercial de forma profesional, alineado con el objetivo SMART de incrementar la captación de leads un 30% anual.

5. Mejora en la experiencia del cliente — trazabilidad desde el primer contacto hasta la postventa, eliminando la pérdida de información entre etapas.

Estratégicos:

6. Toma de decisiones basada en datos — los tableros de BI permiten a los directivos visualizar KPIs de rentabilidad, costos y avance de obra en tiempo real, reemplazando decisiones ad hoc.

7. Escalabilidad para la expansión — una arquitectura Cloud-First y procesos documentados habilitan a la empresa a gestionar múltiples proyectos en simultáneo, condición necesaria para la visión de expansión nacional e internacional.

4. Cronograma

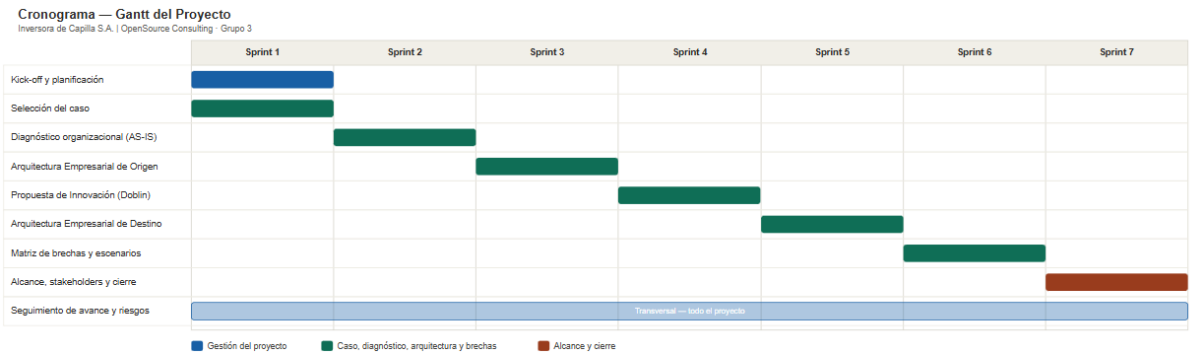


Figura 2: Cronograma Gantt | OpenSource Consulting · Grupo 3

5. Stakeholders

Stakeholder	Interés	Influencia	Clasificación	Estrategia
Socios/Directivos (Ramiro Illa y socio)	Alto	Alto	Promotores	Comprometer estrechamente
Equipo administrativo (3 personas)	Alto	Medio	Promotores	Comprometer estrechamente
Personal de obra y contratistas (40-70)	Medio	Bajo	Apáticos	Notificar y monitorear
Equipo de marketing (subcontratado)	Medio	Bajo	Apáticos	Notificar y monitorear
Inmobiliarias (subcontratadas)	Medio	Bajo	Latentes	Mantener satisfechos
Estudio contable externo	Bajo	Medio	Defensores	Mantener informados
Proveedores/Corralones	Bajo	Bajo	Apáticos	Notificar y monitorear

Razonamiento de los casos más importantes:

- **Directivos → Promotores:** Son el sponsor del proyecto, tienen alto interés en la transformación y alta influencia para aprobarlo o frenarlo.
- **Equipo administrativo → Promotores:** Son los usuarios principales del sistema, su adopción es crítica para el éxito.
- **Contratistas → Apáticos:** Baja influencia pero son numerosos — si no adoptan las herramientas de reporte móvil el proyecto falla operativamente.
- **Estudio contable → Defensores:** Pueden verse afectados por cambios en cómo reciben información financiera pero tienen baja influencia directa.

Matriz de Stakeholders

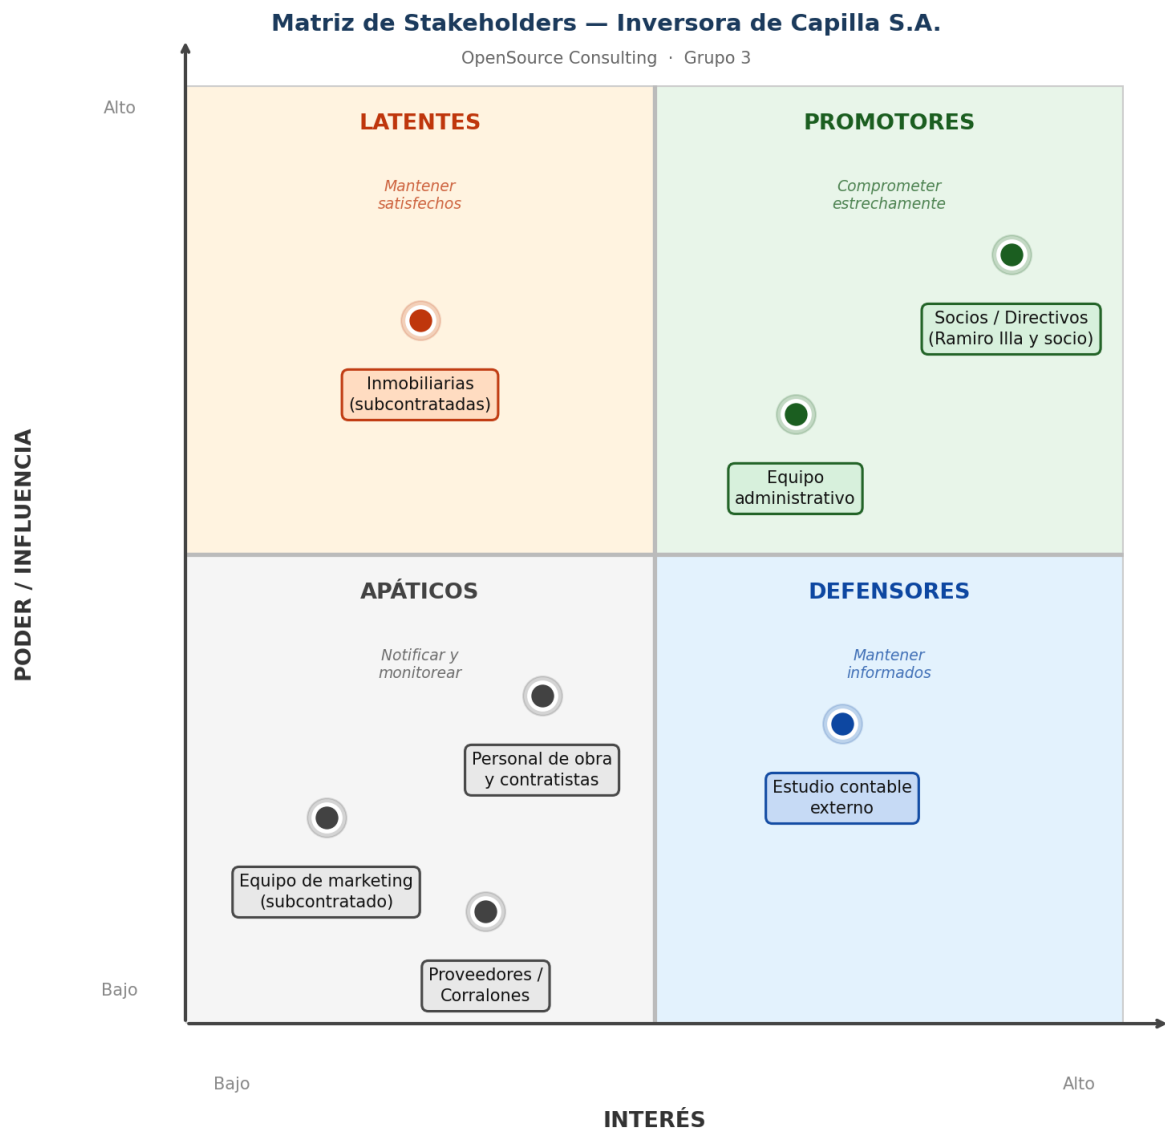


GRAFICO RESUMEN



Figura 3: Gráfico Araña — AE Base, Transición y Destino | OpenSource Consulting · Grupo 3
